Обмерный план 1Е

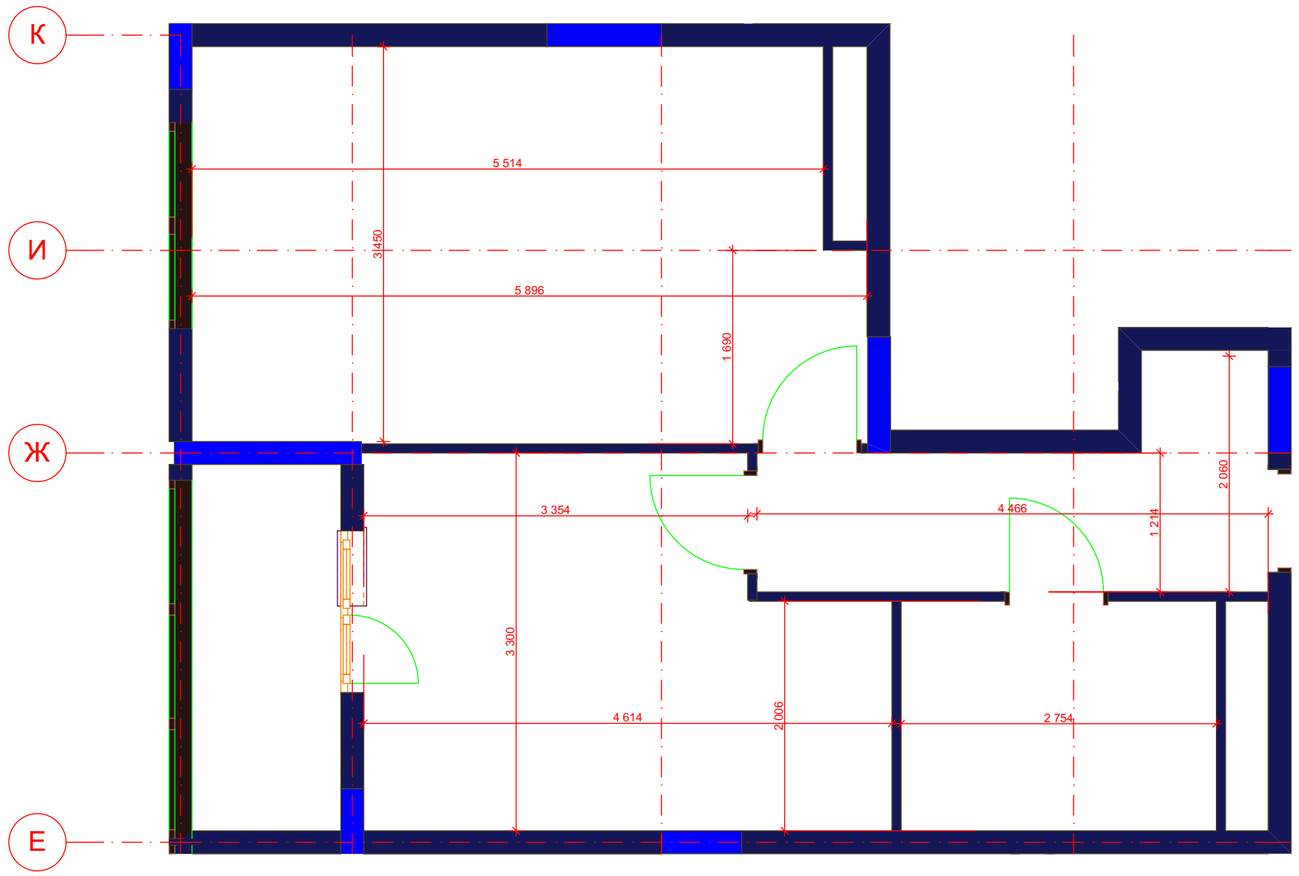

				ЛБ24К2.2 1			
ГАП				однокомнатная квартира			
ГИП							
Нач. отд.				корпус №24.2	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.							
Рук. гр.					П	1	
Проверил				Обмерный план	© http://proftehworld.ru/		
Проектировал							
Н. контр.							

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

График ЛБ-К24.2. 1е

	Наименование работ	Кол-во чел.	Рабочие дни																																												
	Сети		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
	Подготовительные работы ,завоз материалов	3																																													
	Водопровод /канализация																																														
1	Прокладка труб и вывод точек подкючений	1																																													
2	Монтаж оконечных приборов	3																																													
	Электромонтажные работы																																														
1	Прокладка проводов ,и монтаж арматуры разеток и выключателей	2																																													
2	Установка рамок и накладок	2																																													
	Стройка																																														
1	Строительство перегородок Газосиликатный блок 600/200/75	3																																													
	Отделка																																														
1	Устройство стяжек	3																																													
2	Оштукатуривание стен	3																																													
3	Установка дверей	2																																													
4	облицовка стен плиткой 200/300	3																																													
5	Улучшенная Шпаклевка стен под обои	3																																													
6	Укладка плитки на пол (прямая укладка)	3																																													
9	Оклейка стен обоями с подгонкой	3																																													
10	Устройство натяжных потолков	3																																													
8	Укладка ламината прямая укладка	3																																													
11	Монтаж плинтусов наличников	3																																													
13	Уборка и вывоз инструмента	3																																													

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

				ЛБ24К2.1е
ГАП				однакомнатная квартира
ГИП				
Нач. отд.				корпус №24.2
Гл. спец.				
Рук. гр.				
Проверил				Сетевой график
Проектировал				
Н. контр.				

Стадия	Лист	Листов
П	2	

© http://proftehworld.ru/
